
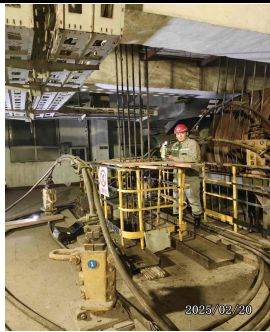
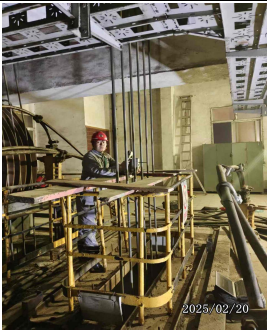



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
1	GX-B1499/23-2-25007	2025/3/3	除吨水百米电耗超限外， 其余所检项目合格。		
2	GX-B1499/23-2-25008	2025/3/3	除吨水百米电耗超限外， 其余所检项目合格。		
3	GX-B1499/23-2-25009	2025/3/3	除吨水百米电耗超限外， 其余所检项目合格。		

4	GX-B1559/22-2-25001	2025/3/3	所检项目合格。	 
5	GX-B1559/22-2-25002	2025/3/3	所检项目合格。	
6	GX-B1559/22-2-25003	2025/3/3	所检项目合格。	


7	GX-B1559/22-2-25004	2025/3/3	所检项目合格。		
8	GX-B1598/24-2-25001	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.35%，小于5%为正常。		
9	GX-B1598/24-2-25002	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.69%，小于5%为正常。		

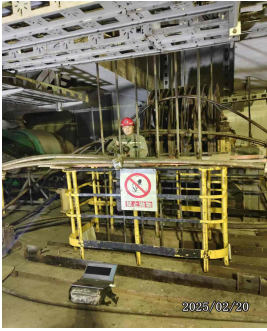

10	GX-B1598/24-2-25003	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.46%，小于5%为正常。	
11	GX-B1598/24-2-25004	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.87%，小于5%为正常。	
12	GX-B1598/24-2-25005	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.04%，小于5%为正常。	

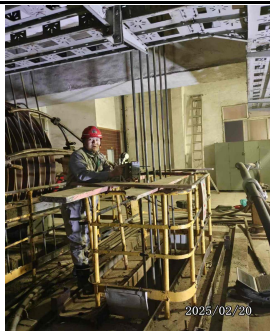13	GX-B1598/24-2-25006	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.62%，小于5%为正常。	
14	GX-B1598/24-2-25007	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.25%，小于5%为正常。	
15	GX-B1598/24-2-25008	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.64%，小于5%为正常。	

16	GX-B1598/24-2-25009	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.35%，小于5%为正常。	
17	GX-B1598/24-2-25010	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.96%，小于5%为正常。	
18	GX-B1598/24-2-25011	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.11%，小于5%为正常。	

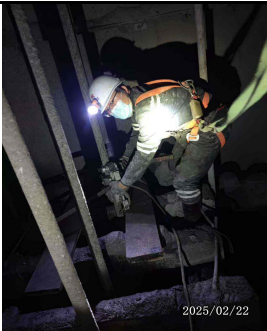19	GX-B1598/24-2-25012	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.34%，小于5%为正常。	
20	GX-B1598/24-2-25013	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.68%，小于5%为正常。	
21	GX-B1598/24-2-25014	2025. 3. 3	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.32%，小于5%为正常。	
